


Passage till Aspenhallen under tiden arbeten sker i del 4.

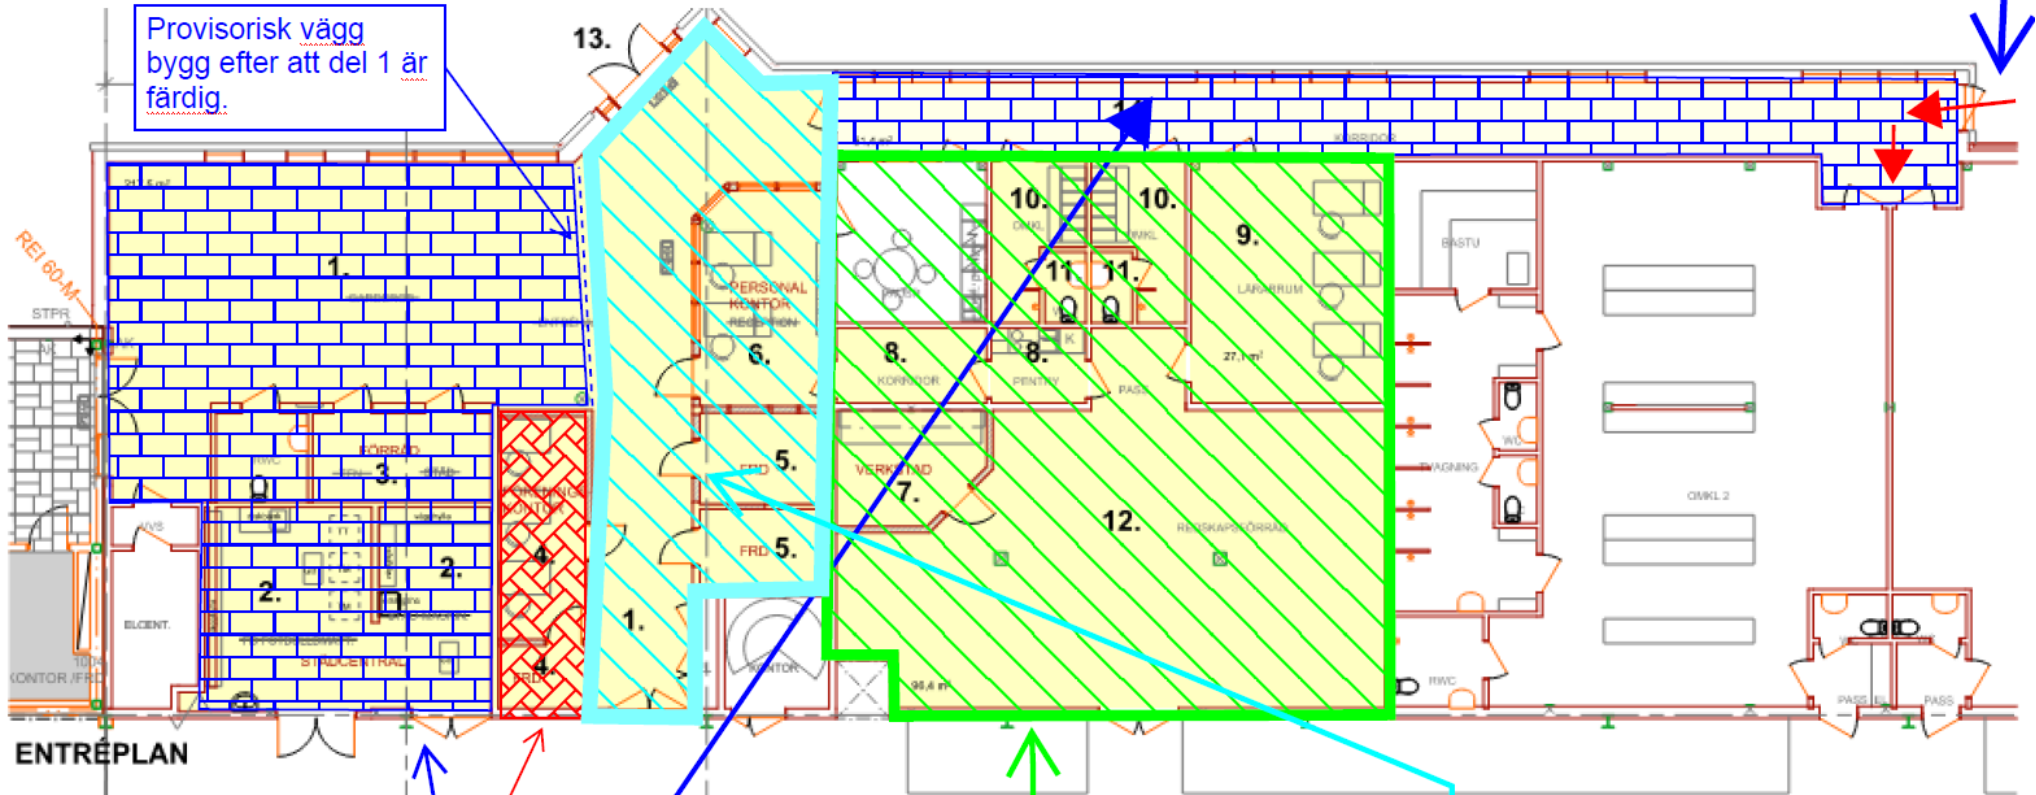

Provisorisk vägg bygg efter att del 1 är färdig.

DEL 1
Den här delen vill vi börja med, helst utan avspärning för att sedan nyttja den som del av avgränsningen.
- Demontering glasparti
- Uppbyggnad väggar
- Ytskikt
- Färdigställande

DEL 2
Startar när del 1 är färdig.
- Demontering/rivning
- Väggar sågas/byggs och anpassas.
- Ytskikt
- Färdigställande

DEL 3
Startar när del 2 är färdig.
- Demontering/rivning
- Väggar byggs och anpassas.
- Ytskikt
- Färdigställande

DEL 4
Startar när del 3 är färdig. Arbeten på plan 2 görs i denna etapp.
- Demontering/rivning
- Väggar anpassas.
- Ytskikt
- Färdigställande

STARTTIDER (cirka)
Del 1: April
Del 2: Maj
Del 3: Juni
Del 4: Augusti
